

**ORODJE ZA PODPORO
PROJEKTNEGA NAČINA DELA –**

**AGITO PROJECT MANAGEMENT
PORTAL**

Maja Žemva

O Agito

- certifikat bonitete odličnosti: **AAA**
- **European Business Awards**
2012/13 National Champion
2013/14 National Champion
med 10 evropskih finalistov v kategoriji Zaposlovalec leta
- **Excellent Small & Medium Enterprise** certifikat 2013



2010
Microsoft Central & Eastern Europe
PARTNER OF THE YEAR
Winner



2010 PARTNER OF THE YEAR
Custom Development Solutions
Smart Client Development
Finalist

**Agito edini v Sloveniji s kompetenco
Silver Project and Portfolio Management**

Microsoft Partner

Gold Application Development


Gold Collaboration and Content

Silver Project and Portfolio Management

Zakaj projektni informacijski sistem

- Prenos projektne metodologije v prakso
- Transparentnost nad projekti
- Standardizacija projektnega vodenja
- Poenostavitev delovanja
- Povečanje uspešnosti projektov
- Spremljanje virov
- Urejena dokumentacija


Uvedba projektnega vodenja

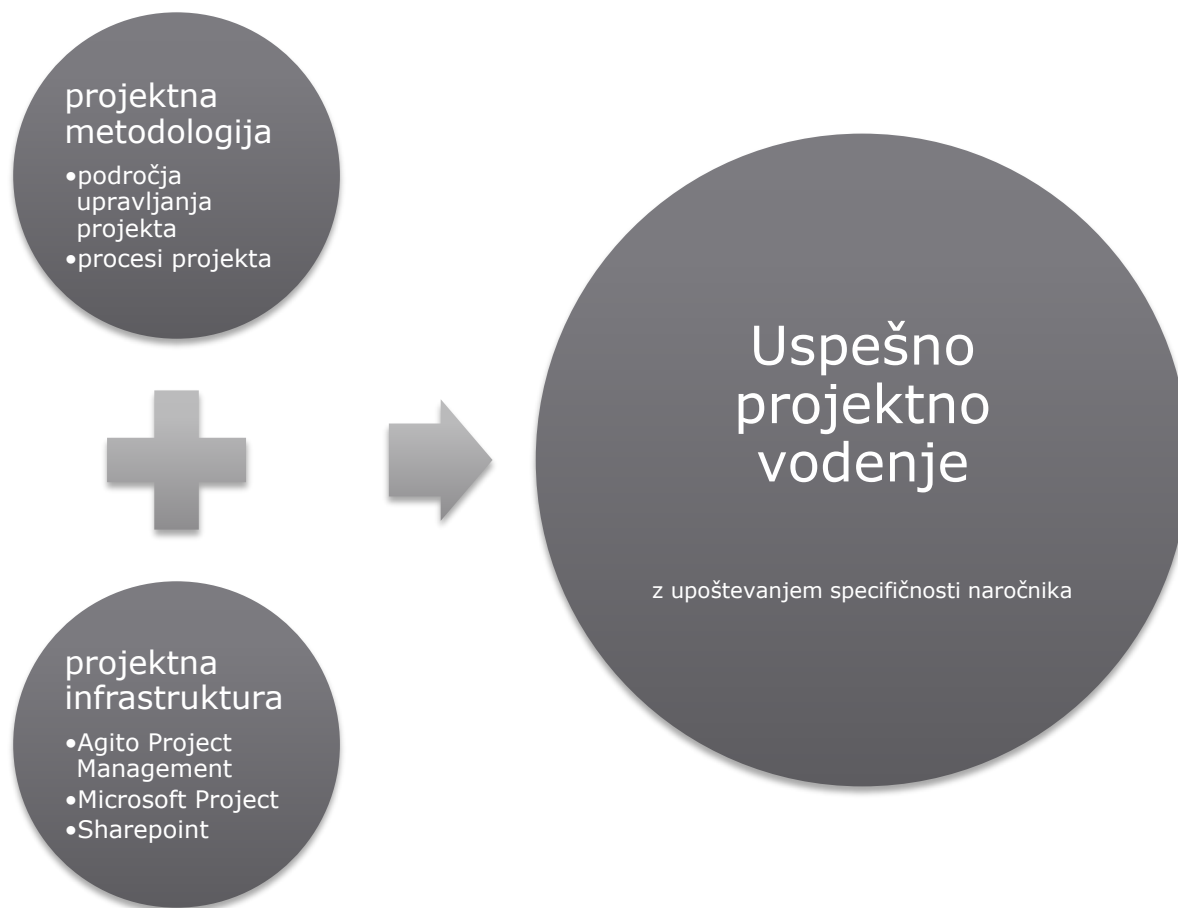


Zakaj APM

- Zmogljiva **platforma**
 - Modularna zasnova
 - Razširitev **po meri** naročnika
 - **Majhna investicija**
 - Enostaven prehod na Microsoft projektni informacijski sistem EPM
-
- Za velika in mala **podjetja, oddelke**
 - Poleg **procesov projektnega vodenja** tudi
 - Ureditev **internega portala**

Agito Project Management Portal

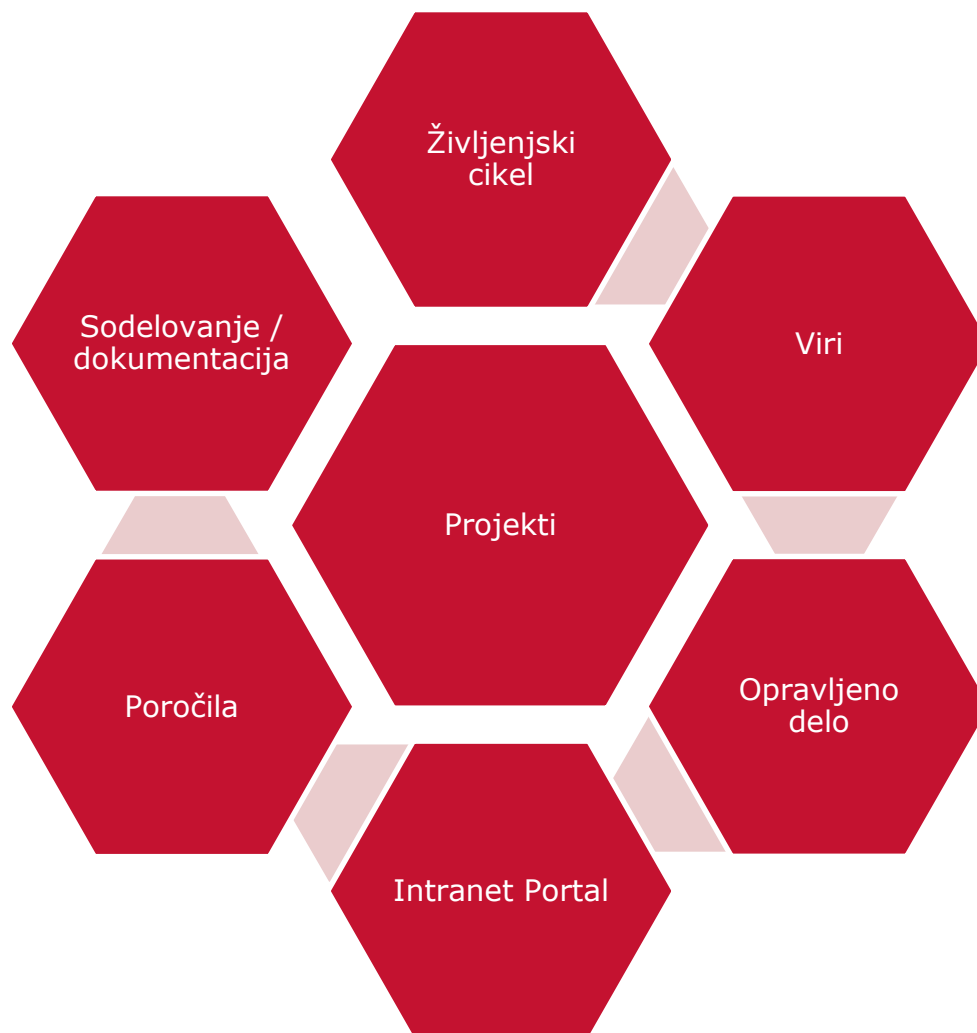

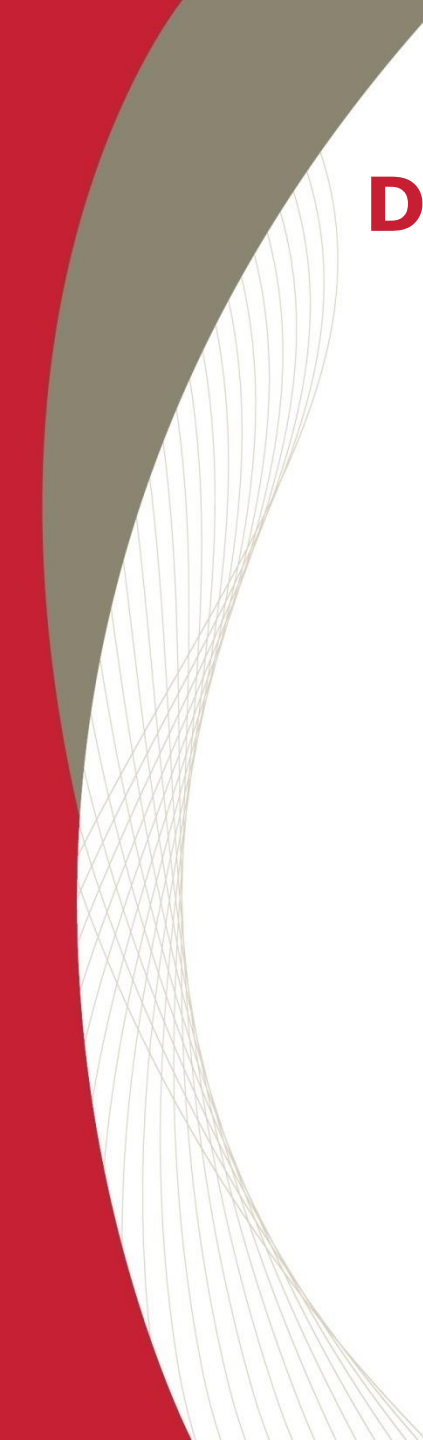

Demo

Project Management Portal

Marjan Kljun

UREDI

PREBRSKAJSTRAN

AGITO

perfect software solutions

10 YEARS

AgitoProjektni portal

Agito

Domov

Dokumenti

Obvestila

Vsebine mesta

Obvestila

Naslov

Telo

EUROPEAN BUSINESS AWARDS 2013/14

Agito je v izboru za European Business Awards ponovno pridobil laskavi naziv »National Champion« in bil med 15.000 evropskimi podjetji izbran med 100 najbolj inovativnih podjetij.

Microsoft kompetence

Pridobili smo nove Microsoft kompetence za »Gold Collaboration and Content«, »Gold Application Development« in »Silver Project and Portfolio Management«

Agito išče nove sodelavce

Si razvijalec programske opreme ali tehnični strokovnjak in iščeš dinamično okolje polno novih izzivov? Potem je Agito prava izbira.

Prosim, pošljite svojo prijavo in življenjepis na zaposlitev@agito.si.

Agito članek

V Računalniških novicah smo objavili Agito članek z naslovom "CRM in B2B se dopolnjujeta". Vsebino članka si lahko preberete tukaj: <http://www.agito.si/SiteCollectionImages/Agito/Consulting/CRM/Agito%20-%20CRM%20in%20B2B.pdf>.

eSeje

Preberite si članek v časopisu Dela:

Podpora za vodenje sestankov – eSeje:

<http://moss.agito.si/marketing/pressclipping/Document%20Library/Agito%20-%20Delo%2011.3.2013.pdf>

Podjetje

- Vizija podjetja
- Politika kakovosti
- Etični kodeks
- Pravila delovanja posameznika

Upravljanje s projekti

- Projektna metodologija
- Projektna predloge
- Navodila za uporabo projektnega strežnika

Priročni dodatki

- Kontaktni podatki sodelavcev
- Predlogi za izboljšave
- Kam na kosilo?

Dodaj nov element

Današnje odsotnosti


Oseba	Od	Do
Tomaž Kuralt	9.10.2013	21.10.2013

Odjavi

Intranet portal

Obvestila

Povezave

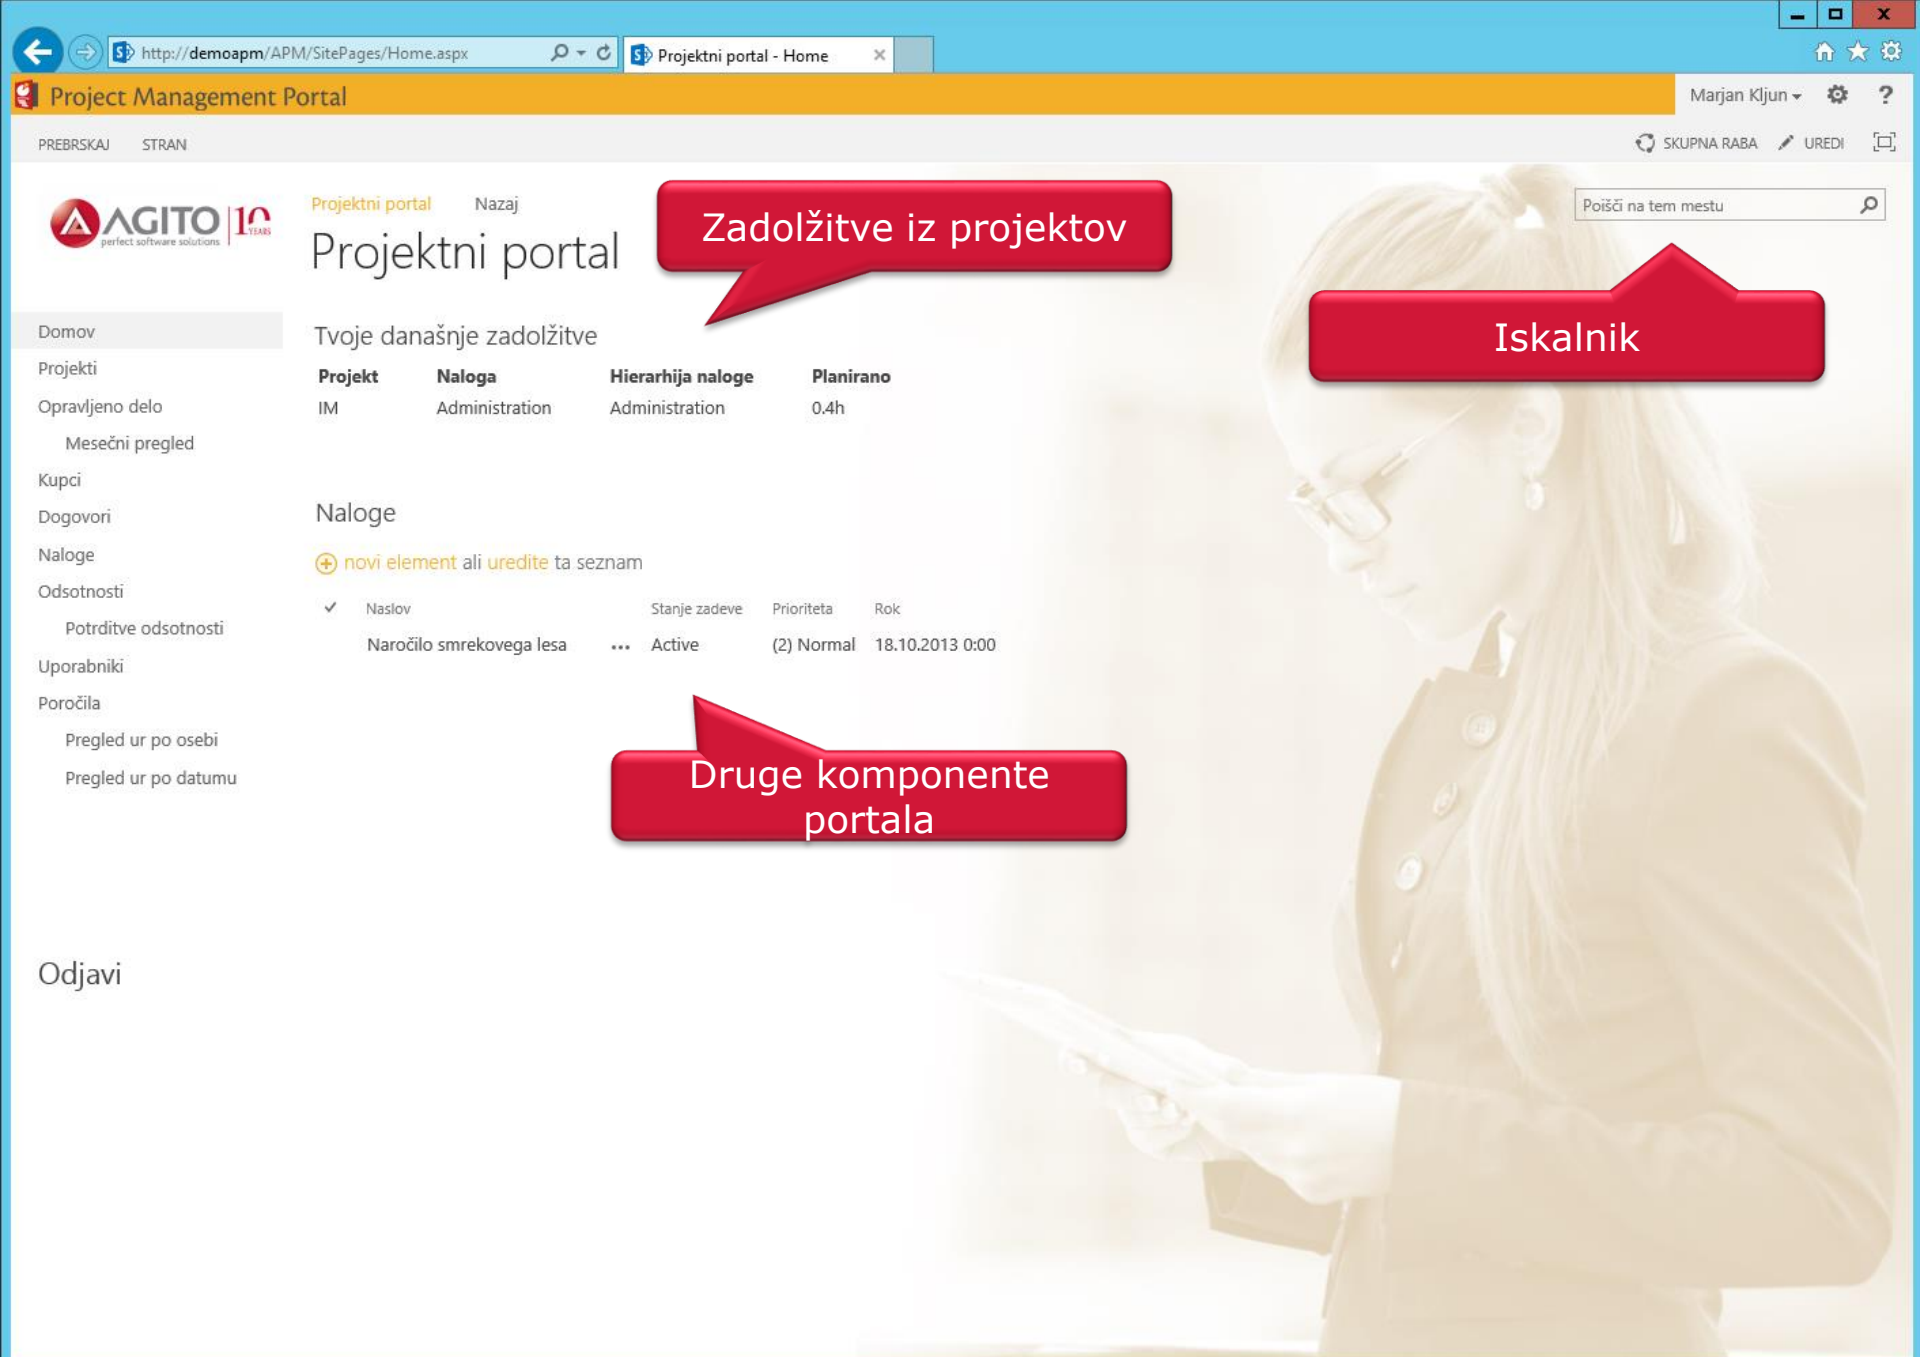

Zadolžitve iz projektov

Iskalnik

Druge komponente
portala

SharePoint

NewsfeedOneDriveSites

Marjan Kljun

BROWSEPROJECTS

Create projectCreate templateOpen projectOpen project siteOpen project fileshareDelete Project

All projects

Views

Moj projekt

Središče za projekte

Središče za vire

Opravljenodelo

Reports


EDIT LINKS

Drsnik s funkcionalnostmi

Name ↑	Status	% finished work	% finished work (baseline)	Start date	Finish date	Deadline	Last published
Dnevna soba FUTUR	In preparation	90,00	92,00	1.3.2014	1.3.2015	1.10.2014	5.4.2014
IT	In preparation	33,00	34,00	1.2.2014	1.2.2015	15.2.2015	8.4.2014
Marketing	In preparation	61,00	61,00	1.1.2014	31.12.2014	20.1.2015	1.4.2014
Predsoba FUTUR	In preparation	84,00	84,00	1.3.2014	1.9.2014	1.4.2015	18.3.2014
Sales	In preparation	60,00	65,00	2.2.2014	2.2.2015	1.4.2015	8.4.2014
Vpeljava HRM	In preparation	32,00	30,00	1.12.2013	1.9.2015	1.10.2015	10.4.2014


Seznam projektov

100%

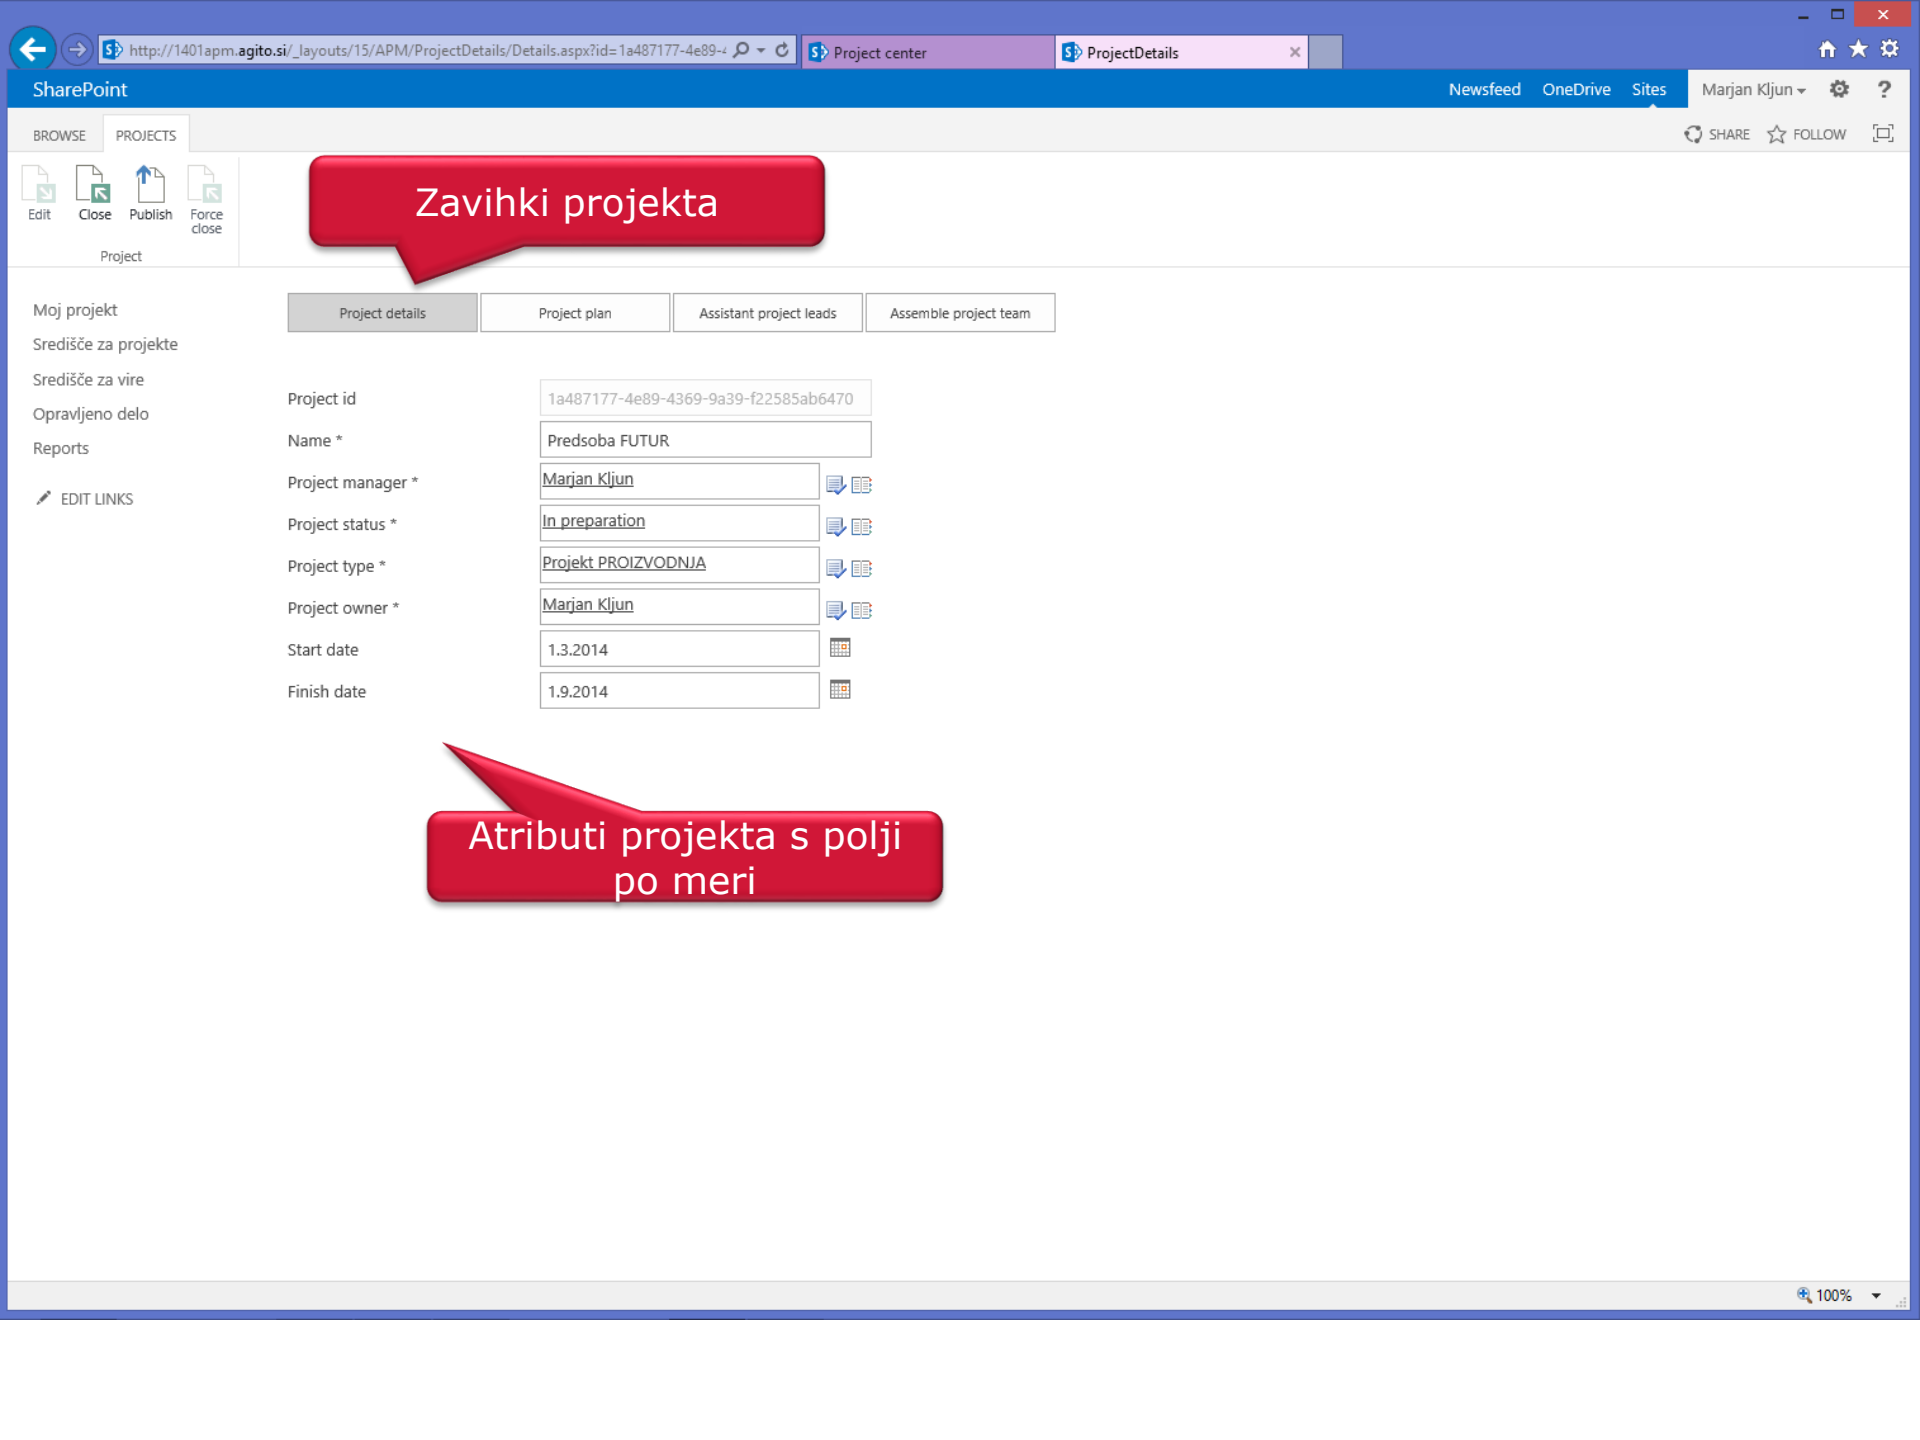

Zavihki projekta

Atributi projekta s polji
po meri

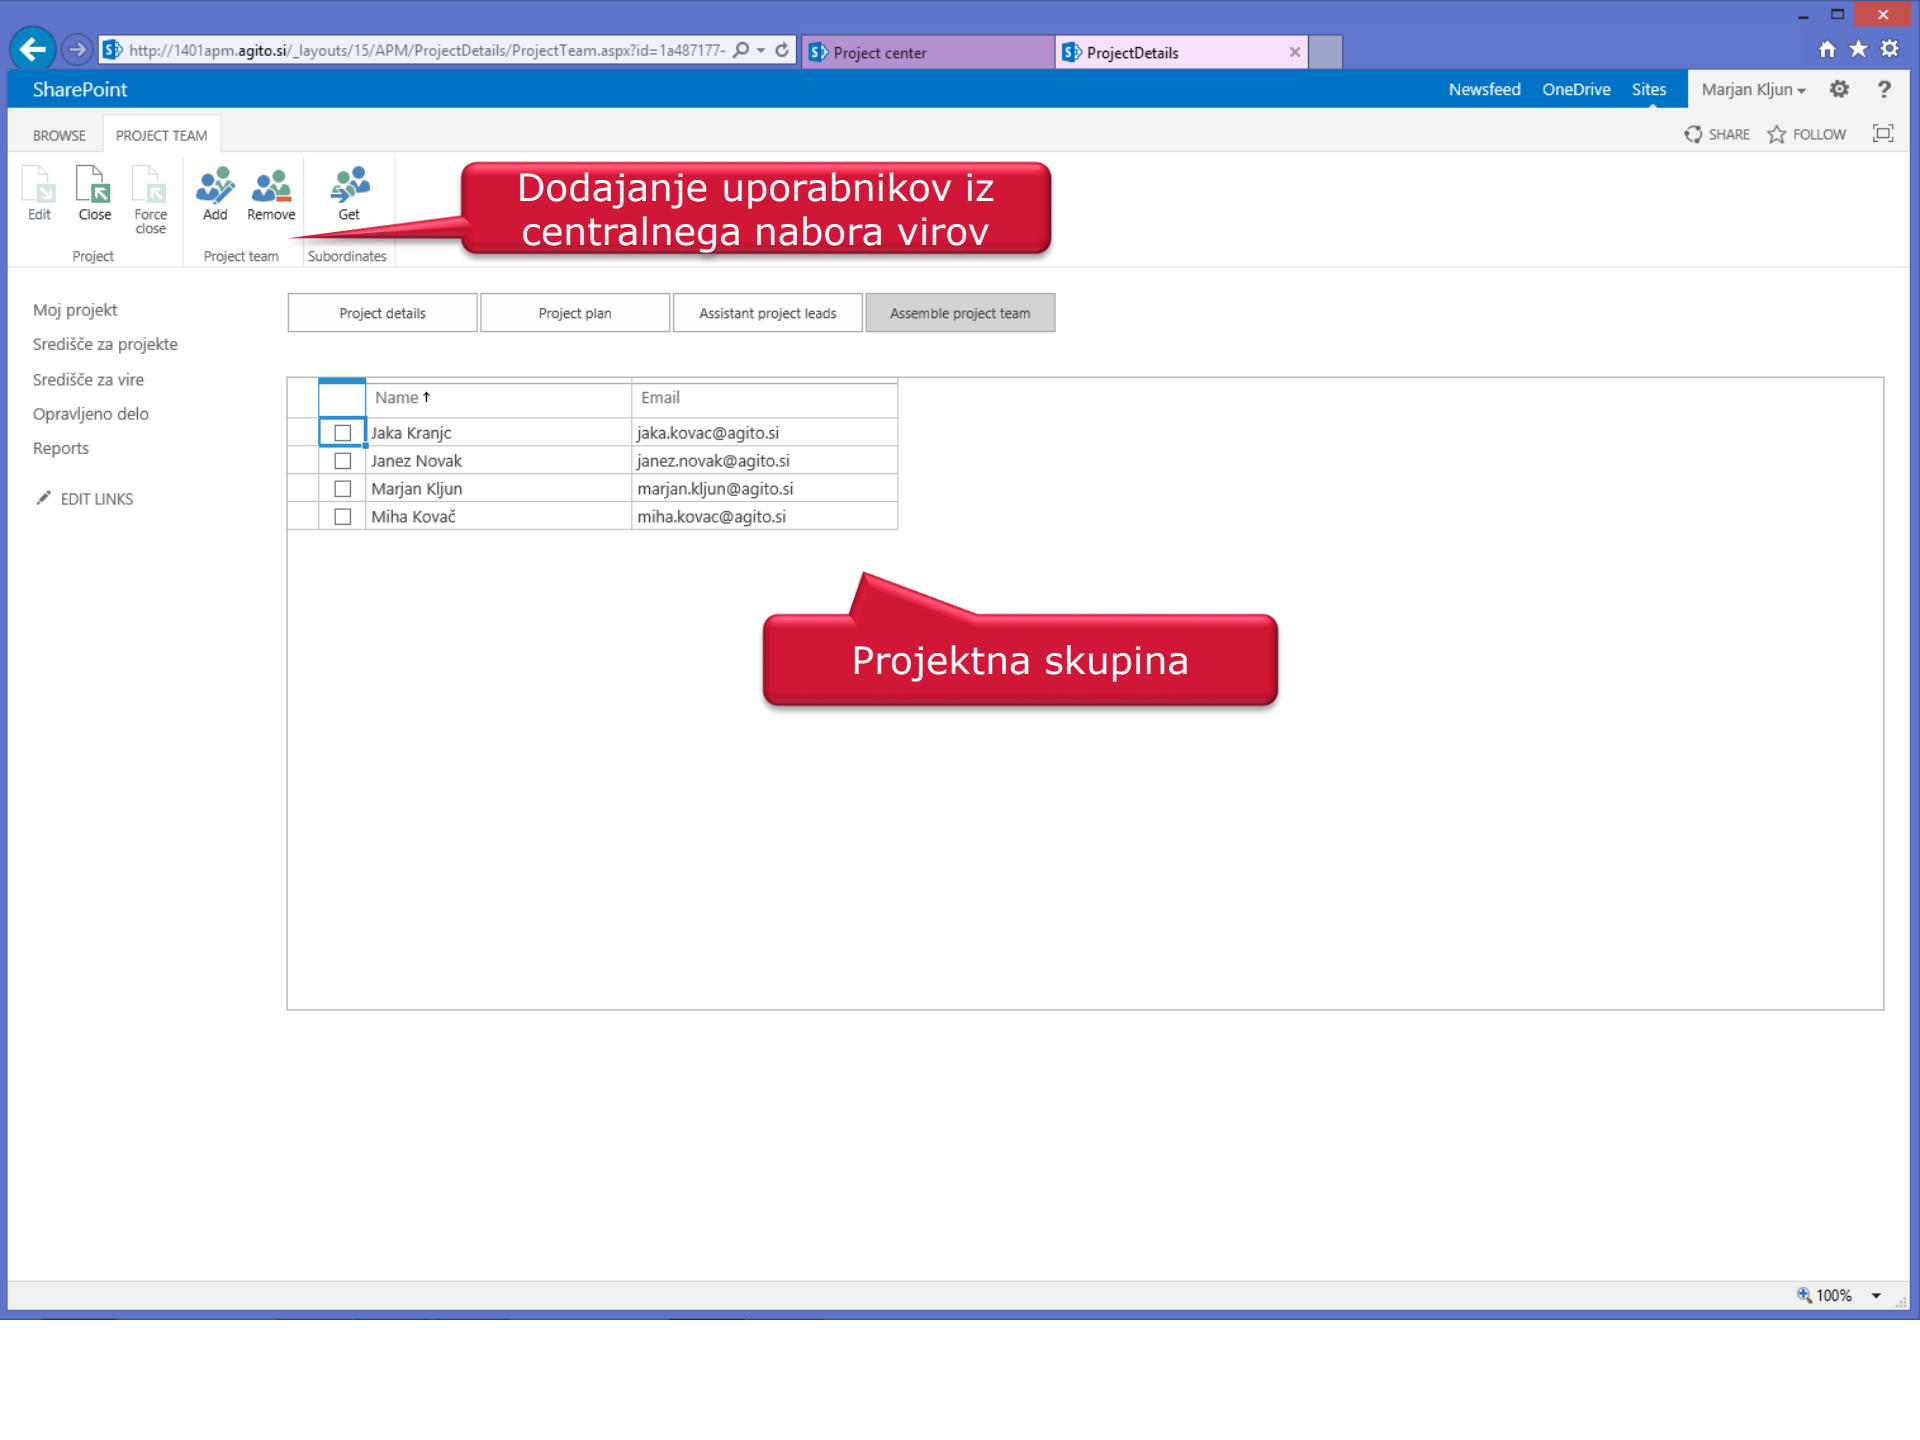

Dodajanje uporabnikov iz
centralnega nabora virov

Projektna skupina

	Name ↑	Email
☐	Jaka Kranjc	jaka.kovac@agito.si
☐	Janez Novak	janez.novak@agito.si
☐	Marjan Kljun	marjan.kljun@agito.si
☐	Miha Kovač	miha.kovac@agito.si

SharePoint

Newsfeed OneDrive Sites

Marjan Kljun

BROWSE

PLANNING

Edit

Close

Force close

New

Edit

Delete

Add

Remove

Previous

Next

Month

Task usage

☐ Actual work

☐ Baseline

☐ Allocation

☒ Capacity

Show

Set

Import

Project

Task

Resource

Time range

Views

Baseline

Clarity

Moj projekt

Središče za projekte

Središče za vire

Opravljenodelo

Reports

EDIT LINKS

Project details

Project plan

Assistant project leads

Assemble project team

1

Analiza - Pregled obstoječih produktov

1.4.2014

31.7.2014

309,91

1

Jaka Kranjc

1.4.2014

31.7.2014

309,91

0,00

2

Analiza - Pregled potreb trga

2.6.2014

29.8.2014

265,00

Jaka Kranjc

2.6.2014

29.8.2014

265,00

0,00

Načrtovanje - Funkcionalnost

1.7.2014

29.8.2014

99,91

Miha Kovač

1.7.2014

29.8.2014

99,91

0,00

4

Načrtovanje - Design

1.8.2014

30.10.2014

360,24

4

Jaka Kranjc

1.8.2014

30.10.2014

180,12

0,00

4

Miha Kovač

1.8.2014

30.10.2014

180,12

0,00

5

Prototip - Izdelava

1.9.2014

30.10.2014

40,04

5

Miha Kovač

1.9.2014

30.10.2014

40,04

0,00

6

Prototip - Testiranje

7

Patentiranje - Priprava dokumentacije

8

Patentiranje - Prijava patenta

9

Priprava tehnologije - Izdelava tehnološkega procesa

April 2014

May 2014

June 2014

July 2014

August 2014

W 105

105

50

49,91

0

C 105

100

50

115

100

W 105

105

50

49,91

0

C 105

100

50

115

100

W 0

0

50

115

100

C 105

100

50

115

100

W 0

0

50

115

100

C 105

100

50

115

100

W 0

0

0

49,91

50

C 105

100

50

115

100

W 0

0

0

49,91

50

C 105

100

50

115

100

W 0

0

0

0

120

C 210

200

100

230

200

W 0

0

0

0

60

C 105

100

50

115

100

W 0

0

0

0

60

C 105

100

50

115

100

W 0

0

0

0

0

C 105

100

50

115

100

W 0

0

0

0

0

C 0

0

0

0

0

W 0

0

0

0

0

C 0

0

0

0

0

W 0

0

0

0

0

C 0

0

0

0

0

W 0

0

0

0

0

C 0

0

0

0

0

Aktivnosti in viri

Različni pogledi

Planiranje projekta

SharePoint

Newsfeed OneDrive Sites

Marjan Kljun

BROWSE

TIMESHEET

Add comment

Assign task

Previous

Next

Timesheet

Time range

Show

Planned work

Moj projekt

Središče za projekte

Središče za vire

Opravljenodelo

Reports

EDIT LINKS

Task name	Work	Actual work
Project name: Dnevna soba FUTUR		
Analiza - Pregled potreb trga	50,01	4,00
Patentiranje - Priprava dokumentacije	120,00	11,00
Project name: Administrative		
Administrative time	0,00	16,00
Sick leave	0,00	13,00
Vacation	0,00	13,00
Summary		

	7.4.2014	8.4.2014	9.4.2014	10.4.2014	11.4.2014	12.4.2014	13.4.2014
A	0	2	2	0	0	0	0
W	3	3	3	3	3	0	0
A	4	3	2	2	0	0	0
W	2	2	2	2	2	0	0
A	0	0	4	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
A	0	5	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
A	0	3	0	0	8	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
A	4	13	8	2	8	0	0
W	5	5	5	5	5	0	0

Vnos opravljenega dela po aktivnostih

Administrativno delo

Vnos komentarjev

100%



Predsoba FUTUR


EDIT LINKS

Projektno mesto projekta

- Home
- Documents
- Tasks
- Calendar
- Site Contents
- EDIT LINKS

Project Summary

Get organized.
[Edit the task list.](#)



Get started with your site REMOVE THIS

Share your site.

Working on a deadline?

Add lists, libraries, and other apps.

Your site. Your brand.

Projektno mesto projekta

Newsfeed

It's pretty quiet here. [Invite](#) more people to the site, or [start](#) a conversation.

Izmenjave informacij
deležnikov projekta

Documents

[+ new document](#) or drag files here

- | ✓ | 📁 | Name ↑ | |
|---|---|---------------------------|-----|
| | 📁 | 0 ProjectManagement | ... |
| | 📁 | 1 Analysis | ... |
| | 📁 | 2 Specifications | ... |
| | 📁 | 3 Technical Documentation | ... |
| | 📁 | 4 User Documentation | ... |
| | 📁 | 5 Testing | ... |
| | 📁 | 6 Deployment | ... |

SharePoint

NewsfeedOneDriveSites

Marjan Kljun

BROWSERESOURCE

OpenAddDeactivateOpen timesheet for user

Resource management

All employees

Views

Moj projekt

Središče za projekte

Središče za vire

Opravljenodelo


Reports

EDIT LINKS

Name ↑	User account	e-mail address	Employee type	Active
Admin Admin	AGITO\administrator		Employed	Active
Boštjan Buh	AGITO\bostjanb	bostjan.buh@agito.si	Employed	Active
Gregor Bobek	AGITO\gregorb	gregor.bobek@agito.si	Employed	Active
Jaka Kranjc	AGITO\JakaK	jaka.kovac@agito.si	Employed	Active
Janez Novak	AGITO\JanezN	janez.novak@agito.si	Employed	Active
Klemen Kozjek	AGITO\klemenko		Employed	Active
Lucija Kukec	AGITO\lucija	lucija.kucec@agito.si	Employed	Active
Luka Žgur	AGITO\lukaz	luka.zgur@agito.si	Employed	Active
Maja Remic	AGITO\maja		Employed	Active
Marjan Kljun	AGITO\marjankljun	marjan.kljun@agito.si	Employed	Active
Marko Kotar	AGITO\markok	marko.kotar@agito.si	Contract	Active
Miha Kovač	AGITO\MihaK	miha.kovac@agito.si	Employed	Active
ServiceAccount APM	AGITO\mosssvcdemo		Employed	Active
Tjaša Panič	AGITO\tjasap	tjasa.panic@agito.si	Employed	Active
Tomaž Kuralt	AGITO\tomaz	tomaz.kuralt@agito.si	Employed	Active
Uroš Horvat	AGITO\UrosH	uros.horvat@agito.si	Employed	Active

Centralni seznam virov

100%

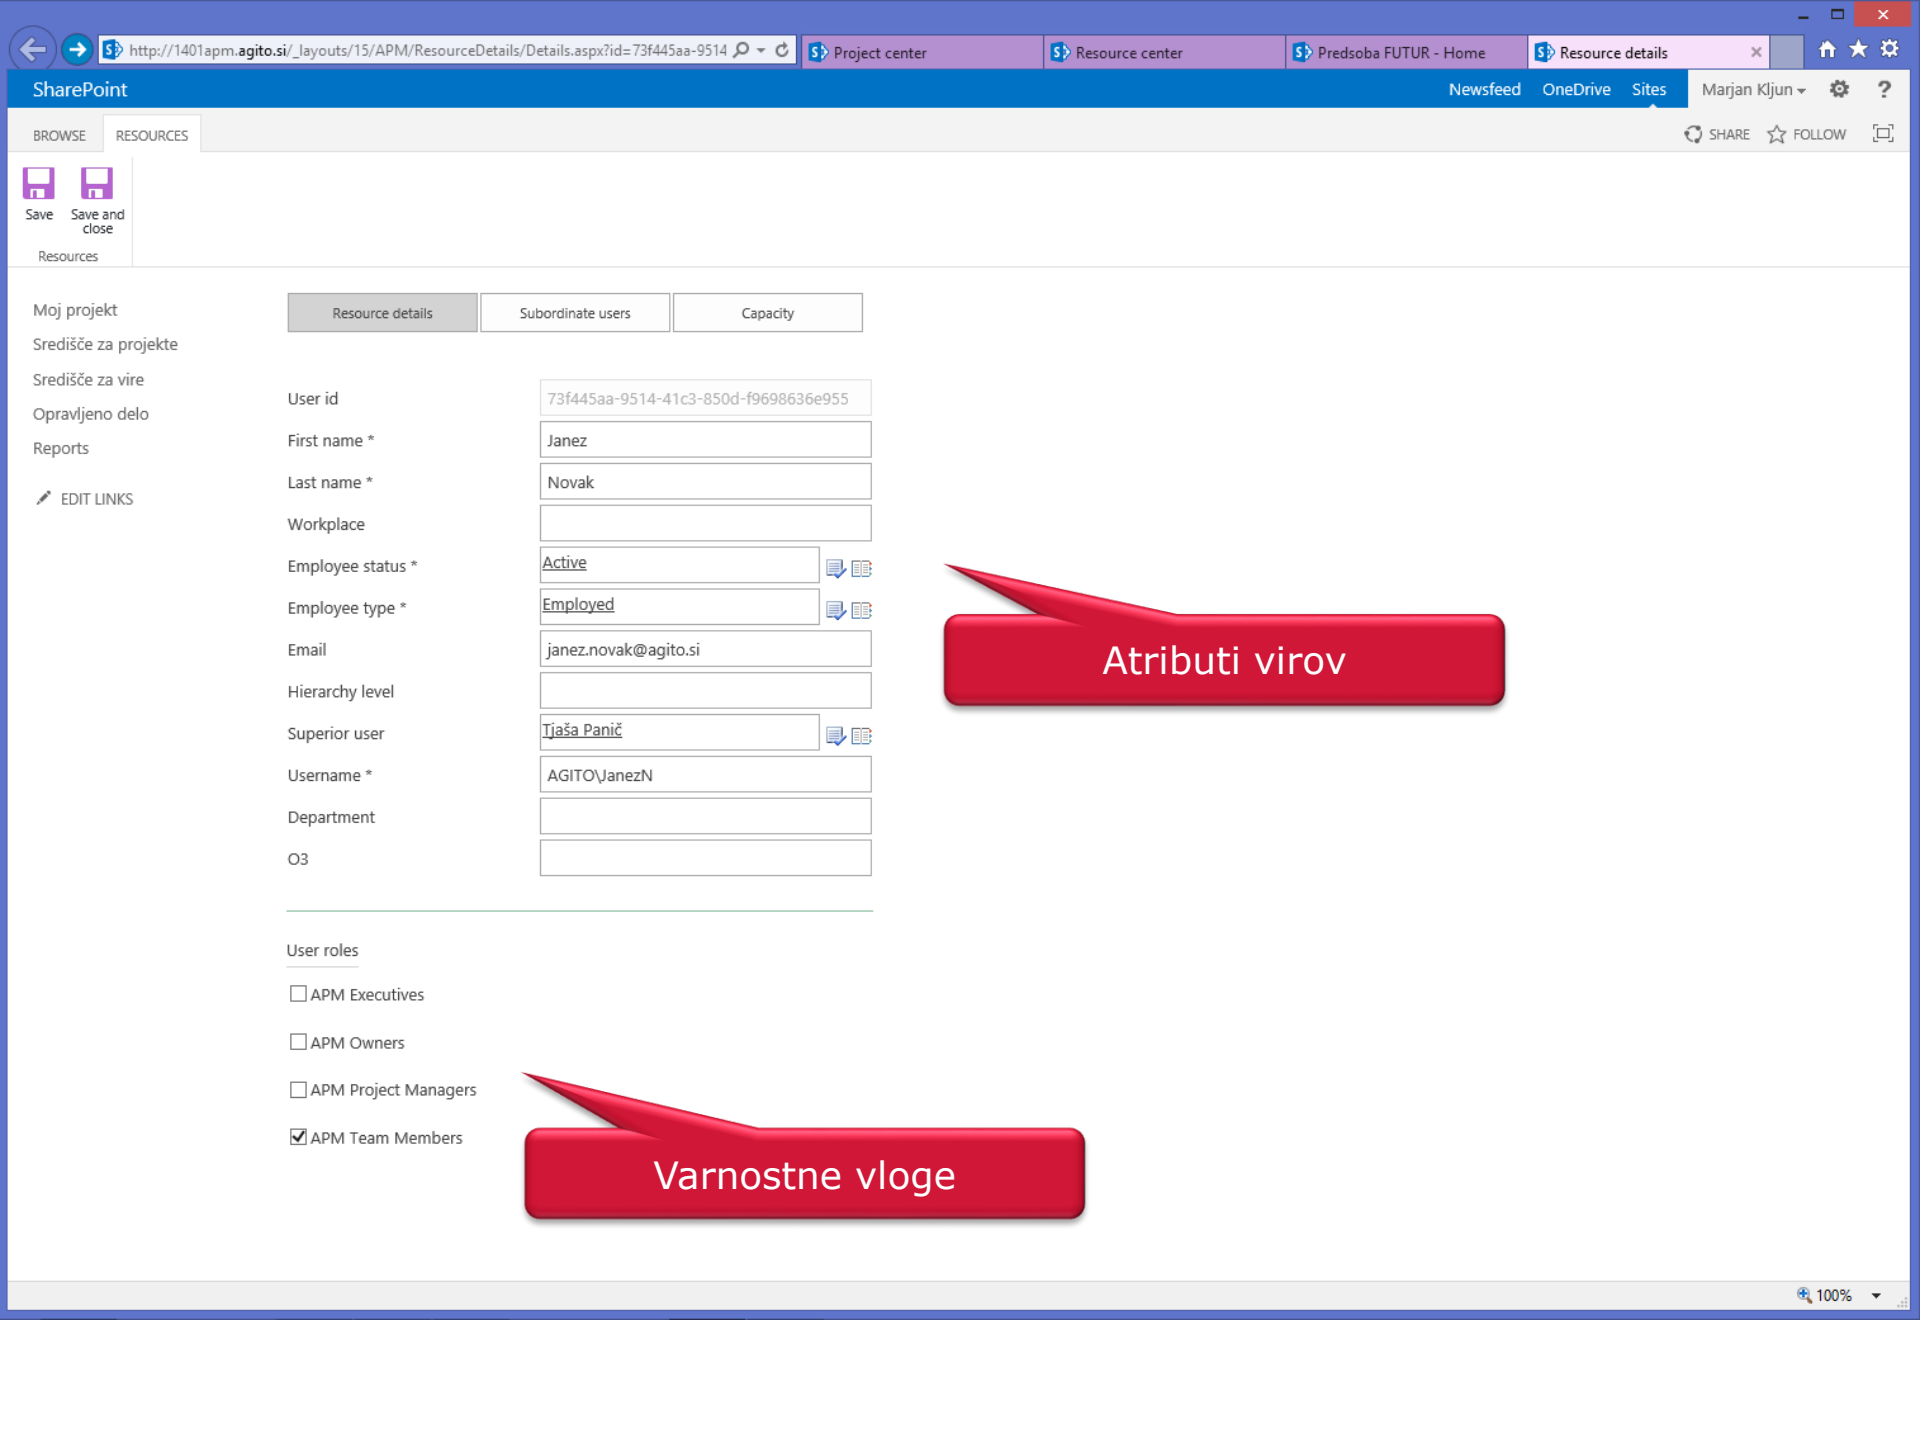

Moj projekt
Središče za projekte
Središče za vire
Opravljenno delo
Reports
EDIT LINKS

Resource details Subordinate users Capacity

User id	73f445aa-9514-41c3-850d-f9698636e955
First name *	Janez
Last name *	Novak
Workplace	
Employee status *	Active
Employee type *	Employed
Email	janez.novak@agito.si
Hierarchy level	
Superior user	Tjaša Panič
Username *	AGITO\JanezN
Department	
O3	

- User roles
- ☐ APM Executives
 - ☐ APM Owners
 - ☐ APM Project Managers
 - ☒ APM Team Members

Atributi virov

Varnostne vloge

SharePoint

NewsfeedOneDriveSites

Marjan Kljun

BROWSE

SHAREFOLLOW

APM

Analyze template

EDIT LINKS

Capacity: Janez Novak

Kapaciteta vira

Resource detailsSubordinate usersCapacity

From ↑	To	Capacity
1.1.1900	12.6.2014	5
30.6.2014	24.7.2014	5
25.7.2014	31.12.9999	8

Moj projekt

Središče za projekte

Središče za vire

Opravljenodelo


Reports

EDIT LINKS

100%

Sinhronizacija z APM

Planiranje z Microsoft Project

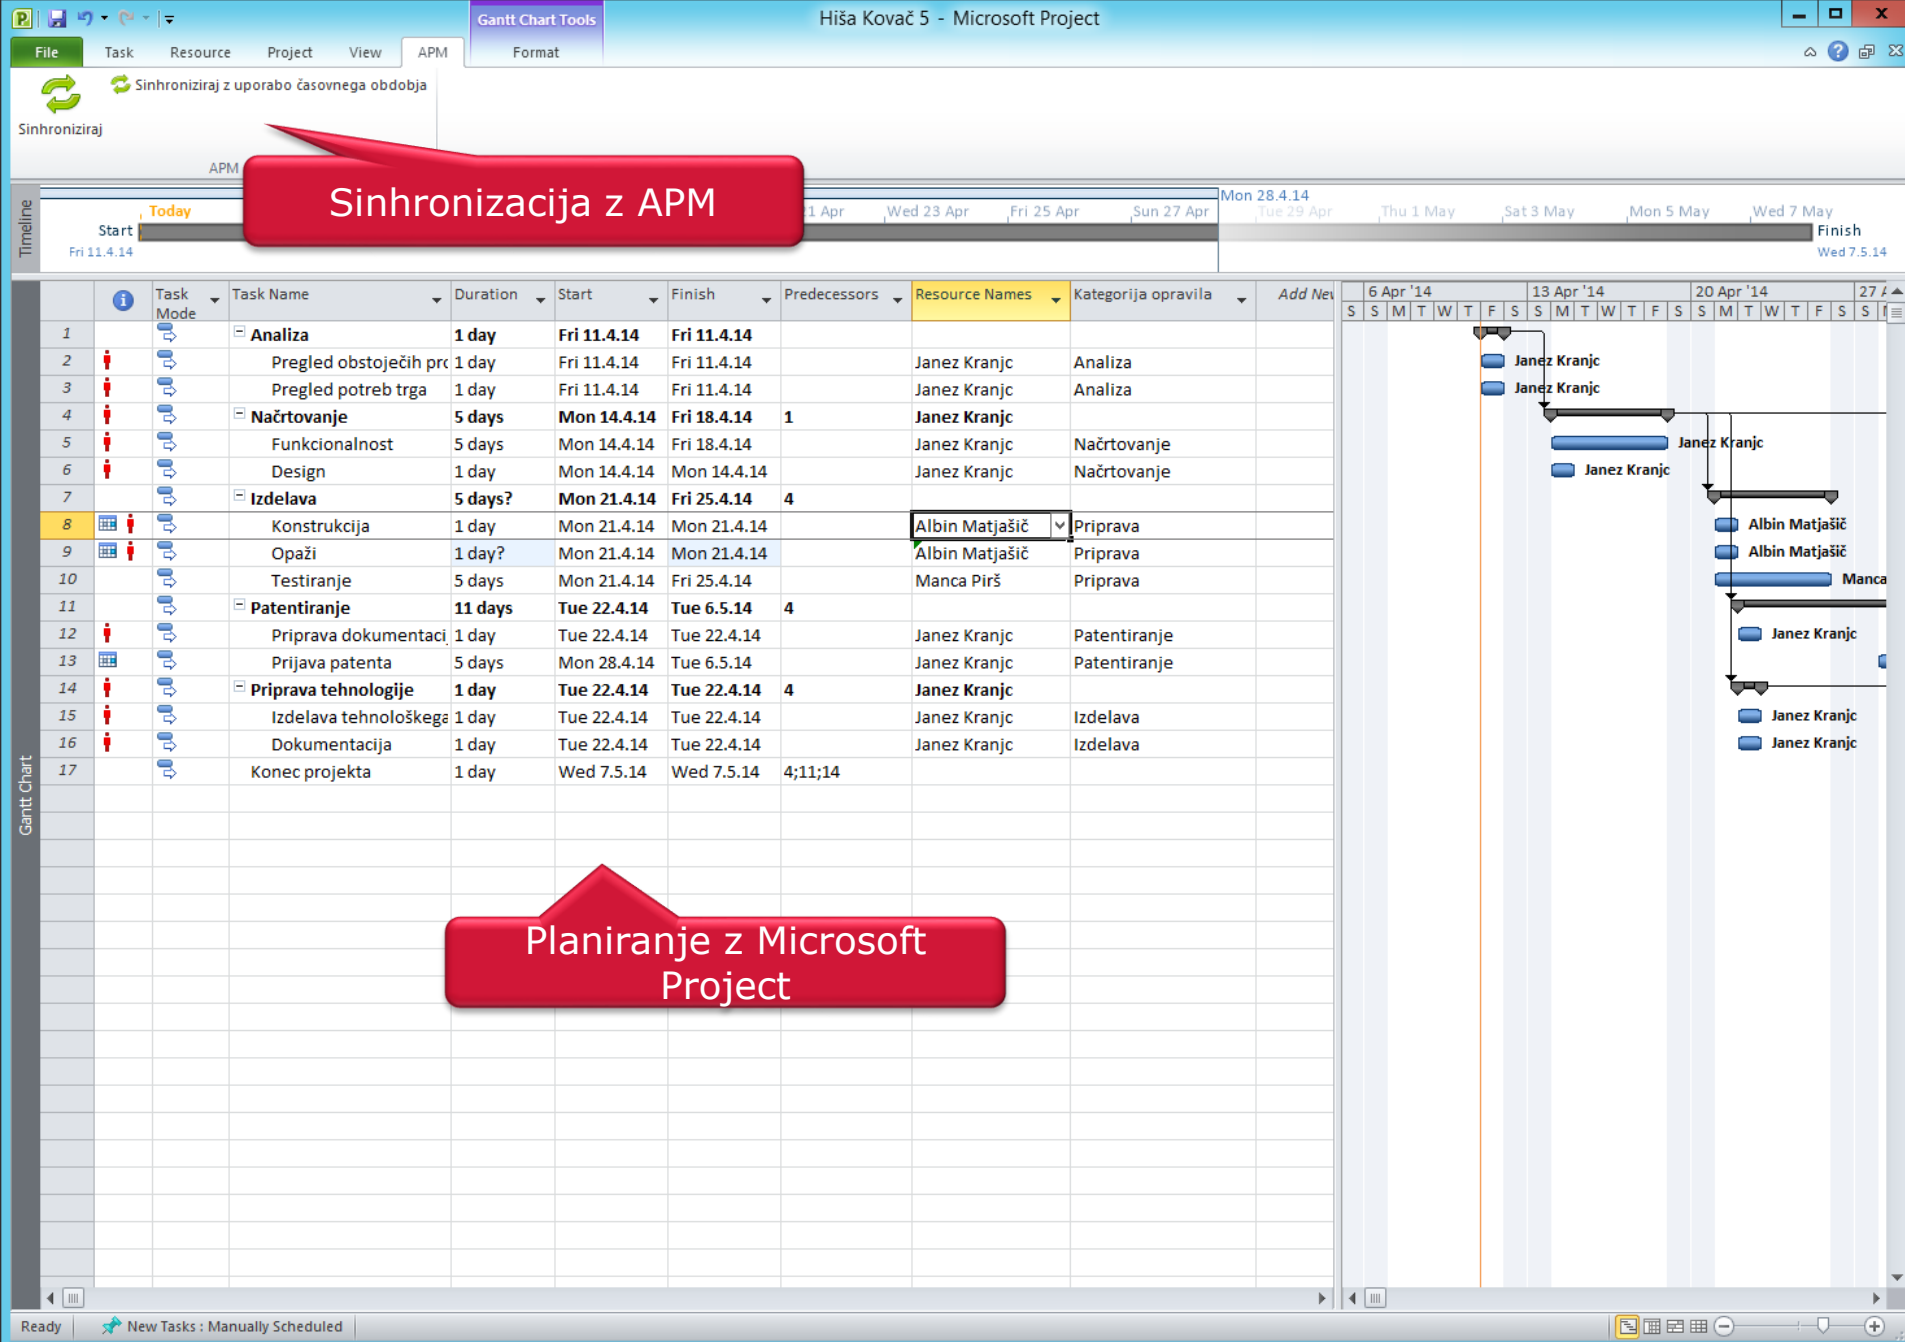

Reports

- Moj projekt
- Središče za projekte
- Središče za vire
- Opravljenost dela
- Reports



EDIT LINKS

Predpripravljeni poročila

Ime poročila	Vrednotenje	Opombe
1. poročilo	100%	
2. poročilo	100%	
3. poročilo	100%	
4. poročilo	100%	

The document icon displays a bar chart with four bars and a table with four rows and two columns. The table data is as follows:

1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4

Employee Dashboard

Last Modified By: Tomaž Kuralc, Date: 4.4.2014
Created By: Tomaž Kuralc



Resources OLAP



Resources OnDemand
Last Modified By: Tomaž Kuralt, Date: 4.4.2014
Created By: Tomaž Kuralt

Sheet1

FILEHOMEINSERTPAGE LAYOUTFORMULASDATAREVIEWVIEWOFFICE REMOTEPOWERPIVOTTeamANALYZEDESIGN

CutCopyFormat PainterClipboard

Font

Alignment

Number

Styles

Cells

Editing

MonthYear

1MonthYear

2ResourcesActive

3ResourcesGeneric

4Role

5TimesheetManager

6

7

8

9

10Row Labels

11Janez Novak

12Miha Koši

13Marko Pirc

14Andrej Novak

15Riko Kovačič

16Janez Kvas

17Marjan Vodnik

18Marko Majcen

19Jože Gartner

20Simon Korošec

21Consultant IdM

22Consultant Sharepoint

23Damjan Koritnik

24Vinko Plahuta

25Tomaž Kovačič

26Janko Vikar

(Multiple Items)

TRUE

(All)

(Multiple Items)

(All)

Column Labels

2014

1

2

3

4

Capacity

Work

Availability

Capacity

Work

Availability

Capacity

Work

Availability

Capacity

Work

Availability

176,00

172,10

3,90

160,00

187,43

-27,43

168,00

141,20

26,80

168,00

144,11

23,89

160,00

166,78

-6,78

160,00

230,59

-70,59

168,00

249,48

-81,48

168,00

175,57

-7,57

176,00

163,61

12,39

160,00

172,45

-12,45

128,00

121,16

6,84

168,00

17,78

150,22

176,00

216,24

-40,24

160,00

191,57

-31,57

168,00

166,49

1,51

168,00

57,35

110,65

136,00

160,48

-24,48

160,00

166,34

-6,34

168,00

226,66

-58,66

168,00

158,63

9,37

176,00

198,80

-22,80

160,00

163,20

-3,20

168,00

171,36

-3,36

168,00

171,36

-3,36

176,00

264,60

-88,60

160,00

141,21

18,79

128,00

225,75

-97,75

168,00

186,68

-18,68

176,00

221,99

-45,99

160,00

194,92

-34,92

168,00

121,75

46,25

168,00

114,30

53,70

136,00

142,94

-6,94

160,00

141,48

18,52

168,00

152,73

15,27

168,00

120,40

47,60

176,00

162,80

13,20

160,00

145,23

14,77

168,00

125,66

42,34

168,00

99,04

68,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

247,06

-247,06

0,00

518,82

-518,82

0,00

0,00

0,00

256,57

-256,57

0,00

246,89

-246,89

160,00

186,99

-26,99

160,00

166,97

-6,97

168,00

211,46

-43,46

168,00

112,58

55,42

176,00

180,28

-4,28

160,00

196,32

-36,32

168,00

134,76

33,24

168,00

107,00

61,00

176,00

261,90

-85,90

160,00

247,73

-87,73

168,00

184,95

-16,95

168,00

103,50

64,50

70,40

49,65

20,75

64,00

54,80

9,20

67,20

36,23

30,97

67,20

22,54

44,66

Poročilo zasedenosti virov

PivotTable Fields

Choose fields to add to report:

☐ ActualWork

☐ Agito Project Type

☐ Availability

☒ Capacity

☒ Month

☒ MonthYear

☒ ProjectName

☒ ResourcesActive

☒ ResourcesGeneric

☒ ResourceName

☒ Role

Drag fields between areas below:

FILTERS

MonthYear

Resource...

Resource...

COLUMNS

Year

Month

Σ Values

ROWS

ResourceNa...

ProjectName

VALUES

Capacity

Work

Availability

☐ Defer

Update

By Resource

By Project

Graph

READY

100 %

Zmogljivosti pivot tabel

APM > Employee Dashboard.xlsx

FILEOPEN IN EXCELDATAFIND

My employees

Boštjan Buh

Employee

Employed

Type

Workplace

OB

Status

40,00

Actual Work

Marjan Kijun

Employee

Employed

Type

Workplace

OB

Status

154,10

Actual Work

AW, and W by Month

100

50

0

February 2014

March 2014

AW

W

Project	Task	Quarter 1, 2014	AW	W
Administrative	Sick leave	8,00	8,00	
	Vacation	12,00	12,00	
Oddelek IT	Četrti task	27,00	25,00	
	Prvi task	27,00	40,00	
Projekt18	task121	5,00	9,00	
Projekt21022014	task 2	8,00	11,00	
	task 3	37,00	11,90	

Filters

VIEW

Corpo

(All)

☐ (All)

☐ (Blank)

☐ Administration

☐ Development

☐ Education

☐ Mentoring

☐ Operation

1

1

1

1

1

1

Employee

(All)

☐ (All)

☐ Boštjan Buh

☐ Marjan Kijun

1

1

Task Group

(All)

☐ (All)

☐ (Blank)

☐ Analysis and new reports

☐ Reports maintenance

☐ Technical Development

1

1

1

1

Task Status

(All)

☐ (All)

☐ Active

☐ Closed

1

1

Dinamična poročila

Drill down, Drill up ...


Prikaz podatkov prilagojen za uporabnika

Filtri...

Data

100%

Arhitektura APM

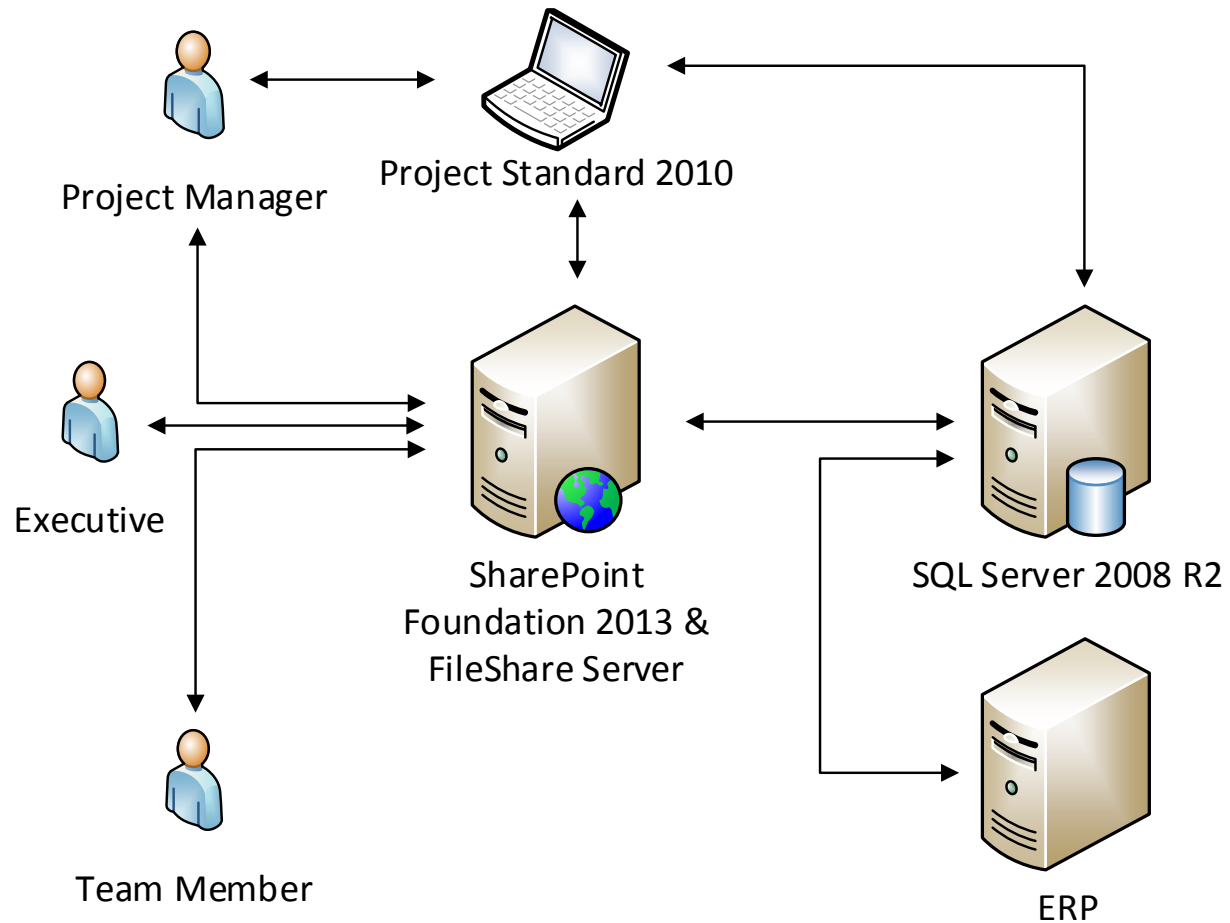

Uvedba

- Pogovor z naročnikom
- Razvoj morebitnih novih komponent
- Namestitev in konfiguracija
- **Izobraževanje na realnih projektih**
- Spremljanje uporabe in pomoč uporabnikom

VEČ INFORMACIJ

- Več informacij:
 - http://www.agito.si/slo/products/EPM/Strani/Agito_PM_Portal.aspx
 - <http://www.agito.si/slo/consulting/Strani/pm.aspx>

Hvala za pozornost

